

ศสช.4 (นม)
เลขที่.....
วันที่ 2 มี.ค. 48
เวลา 09.47 น.
ศสช.สป.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โทร 51741

ที่ มท 0210.5/จ 59

วันที่ 1 มีนาคม 2548

เรื่อง การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร ตามโครงการฯ ทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3

เรียน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

ตามที่ สป.มท. ทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการติดตั้งตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 กับ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด นั้น

บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ณ สถานที่ต่าง ๆ ในต่างจังหวัดตามเอกสารที่แนบ จึงขอความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม และประสานรายละเอียดกับคณะทำงานโครงการฯ โทร. 51741

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

แผนการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	February		March	
					Feb	Mar	Mar	Mar
1	แผนการติดตั้งระบบเส้นใยแก้วนำแสง(Optical Fiber MOI)	42 days	Wed 16/2/05	Tue 29/3/05	[Summary Bar]			
2	แผนการติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ ทีมที่ 1	30 days	Thu 24/2/05	Fri 25/3/05	[Summary Bar]			
3	ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์-ศูนย์ฯเขต 1 อุตรดิตถ์	3 days	Thu 24/2/05	Sat 26/2/05	[Task Bar]			
4	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Thu 24/2/05	Sat 26/2/05	[Task Bar]			
5	ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์-ศูนย์ฯเขต 3 นครสวรรค์	3 days	Sun 27/2/05	Tue 1/3/05	[Task Bar]			
6	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Sun 27/2/05	Tue 1/3/05	[Task Bar]			
7	ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์-สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์	3 days	Wed 2/3/05	Fri 4/3/05	[Task Bar]			
8	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Wed 2/3/05	Fri 4/3/05	[Task Bar]			
9	ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก-ศูนย์ฯเขต 5 พิษณุโลก	4 days	Sat 5/3/05	Tue 8/3/05	[Task Bar]			
10	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	4 days	Sat 5/3/05	Tue 8/3/05	[Task Bar]			
11	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่-สถานีสื่อสารจังหวัดเชียงใหม่	3 days	Wed 9/3/05	Fri 11/3/05	[Task Bar]			
12	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Wed 9/3/05	Fri 11/3/05	[Task Bar]			
13	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่-ศูนย์ฯ เขต 7 เชียงใหม่	4 days	Sat 12/3/05	Tue 15/3/05	[Task Bar]			
14	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	4 days	Sat 12/3/05	Tue 15/3/05	[Task Bar]			
15	ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน-สถานีสื่อสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน	3 days	Wed 16/3/05	Fri 18/3/05	[Task Bar]			
16	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Wed 16/3/05	Fri 18/3/05	[Task Bar]			
17	ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-ศูนย์ฯ 5 สุราษฎร์ธานี	3 days	Sat 19/3/05	Mon 21/3/05	[Task Bar]			
18	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Sat 19/3/05	Mon 21/3/05	[Task Bar]			
19	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น-ศูนย์ฯ เขต 6 ขอนแก่น	2 days	Tue 22/3/05	Wed 23/3/05	[Task Bar]			
20	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	2 days	Tue 22/3/05	Wed 23/3/05	[Task Bar]			
21	ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา-ศูนย์ฯ 4 นครราชสีมา	2 days	Thu 24/3/05	Fri 25/3/05	[Task Bar]			
22	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	2 days	Thu 24/3/05	Fri 25/3/05	[Task Bar]			
23	แผนการติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ ทีม 2	42 days	Wed 16/2/05	Tue 29/3/05	[Summary Bar]			
24	ศาลากลางจังหวัดนครปฐม-ศูนย์ฯเขต 3 นครปฐม	16 days	Wed 16/2/05	Thu 3/3/05	[Task Bar]			
25	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	16 days	Wed 16/2/05	Thu 3/3/05	[Task Bar]			
26	ศาลากลางจังหวัดชลบุรี-ศูนย์ฯเขต 2 ชลบุรี	3 days	Fri 4/3/05	Sun 6/3/05	[Task Bar]			
27	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Fri 4/3/05	Sun 6/3/05	[Task Bar]			
28	ศาลากลางจังหวัดระยอง-สถานีสื่อสารจังหวัดระยอง	1 day	Mon 7/3/05	Mon 7/3/05	[Task Bar]			
29	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	1 day	Mon 7/3/05	Mon 7/3/05	[Task Bar]			
30	ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ-สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรปราการ	1 day	Tue 8/3/05	Tue 8/3/05	[Task Bar]			
31	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	1 day	Tue 8/3/05	Tue 8/3/05	[Task Bar]			

Project: Optical Fiber Installation

Task 

Split 

Progress 

Milestone 

Summary 

Project Summary 

External Tasks 


External Milestone 

Deadline 

แผนการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Mar 2 2005 09:36 P.03

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	February		March	
					Feb	Mar		
32	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม-สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม	2 days	Wed 9/3/05	Thu 10/3/05				
33	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	2 days	Wed 9/3/05	Thu 10/3/05				
34	ศาลากลางจังหวัดระนอง-สถานีสื่อสารจังหวัดระนอง	3 days	Fri 11/3/05	Sun 13/3/05				
35	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Fri 11/3/05	Sun 13/3/05				
36	ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-ศูนย์เขต 10 สุราษฎร์ธานี	1 day	Mon 14/3/05	Mon 14/3/05				
37	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	1 day	Mon 14/3/05	Mon 14/3/05				
38	ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช-ศูนย์เขต 11 นครศรีธรรมราช	3 days	Tue 15/3/05	Thu 17/3/05				
39	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	3 days	Tue 15/3/05	Thu 17/3/05				
40	ศาลากลางจังหวัดสงขลา-ศูนย์เขต 12 สงขลา	4 days	Fri 18/3/05	Mon 21/3/05				
41	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	4 days	Fri 18/3/05	Mon 21/3/05				
42	ศาลากลางจังหวัดปัตตานี-สถานีสื่อสารจังหวัดปัตตานี	2 days	Tue 22/3/05	Wed 23/3/05				
43	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	2 days	Tue 22/3/05	Wed 23/3/05				
44	ศาลากลางจังหวัดกระบี่-สถานีสื่อสารจังหวัดกระบี่	2 days	Thu 24/3/05	Fri 25/3/05				
45	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	2 days	Thu 24/3/05	Fri 25/3/05				
46	ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต-สถานีสื่อสารจังหวัดภูเก็ต	4 days	Sat 26/3/05	Tue 29/3/05				
47	- ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์	4 days	Sat 26/3/05	Tue 29/3/05				

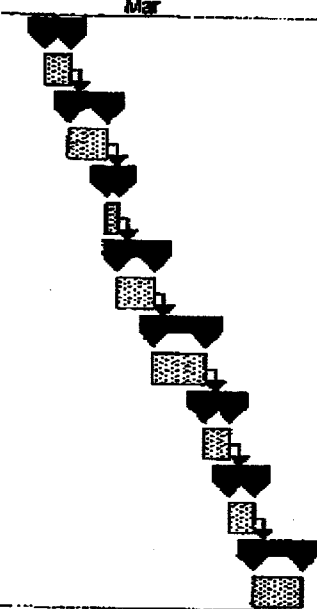

Fax:50204

Project: Optical Fiber Installation

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	
